

市街地再開発事業の工事進捗状況について



【住宅棟工区】…1階から3階までの在来工法による躯体工事が完了し、4階からはPC（プレキャスト）工法による躯体工事を進めております。躯体工事は概ね1フロア6日のサイクルで進み、写真の時点では8階床コンクリートの打設が完了した段階となり、本年12月末までには12階床までのコンクリート打設が完了予定です。

※PC工法とは…建物の基本となるコンクリート部材をあらかじめ工場で製造した後、現場へ持ち込み組立てる工法です。高品質・高精度の耐久性の高い構造体が得られ、工期短縮につながります。

【交通広場棟工区】…地上躯体工事が完了し、交通広場となる3階(屋上)部分については、12月17日の供用開始に向けて、仕上げ工事を進めています。

【商業・業務棟工区】…工区西側において躯体工事を、工区南側において擁壁築造工事を進めております。現在、駅と南口とを繋ぐ仮設連絡橋については、交通広場の供用をもって撤去し、工区東側の工事に着手します。



引き続き、細心の注意をもって施工いたしますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

8/8 東西自由通路の供用が開始されました！

相鉄線南側の二俣川上部に駅改札階からさちが丘陸橋方面（西側）へと繋がる自由通路（事業主体：相模鉄道(株)・(株)相鉄アーバンクリエイツ、施工業者：西松建設・NB建設共同企業体）が整備され、8/8 より供用が開始されました。この通路の一部は仮設供用であるため、住宅棟工事完成後に本設の通路を再開発区域内に整備いたします。




12/17 より交通広場の供用を開始いたします。

12/17 より、本設の交通広場を供用します。交通広場には以下の施設を設置します。

- ・バス乗降場（上屋・誘導ブロックつき）、タクシー乗降場（のりば1か所）
- ・二俣川駅と交通広場とを繋ぐ階段及びエレベータ（24時間利用可能）

※仮一般車転回場の位置は変更ありません。一般車及びオートバイの交通広場内への乗り入れはできません。

【交通広場計画（供用開始時）】

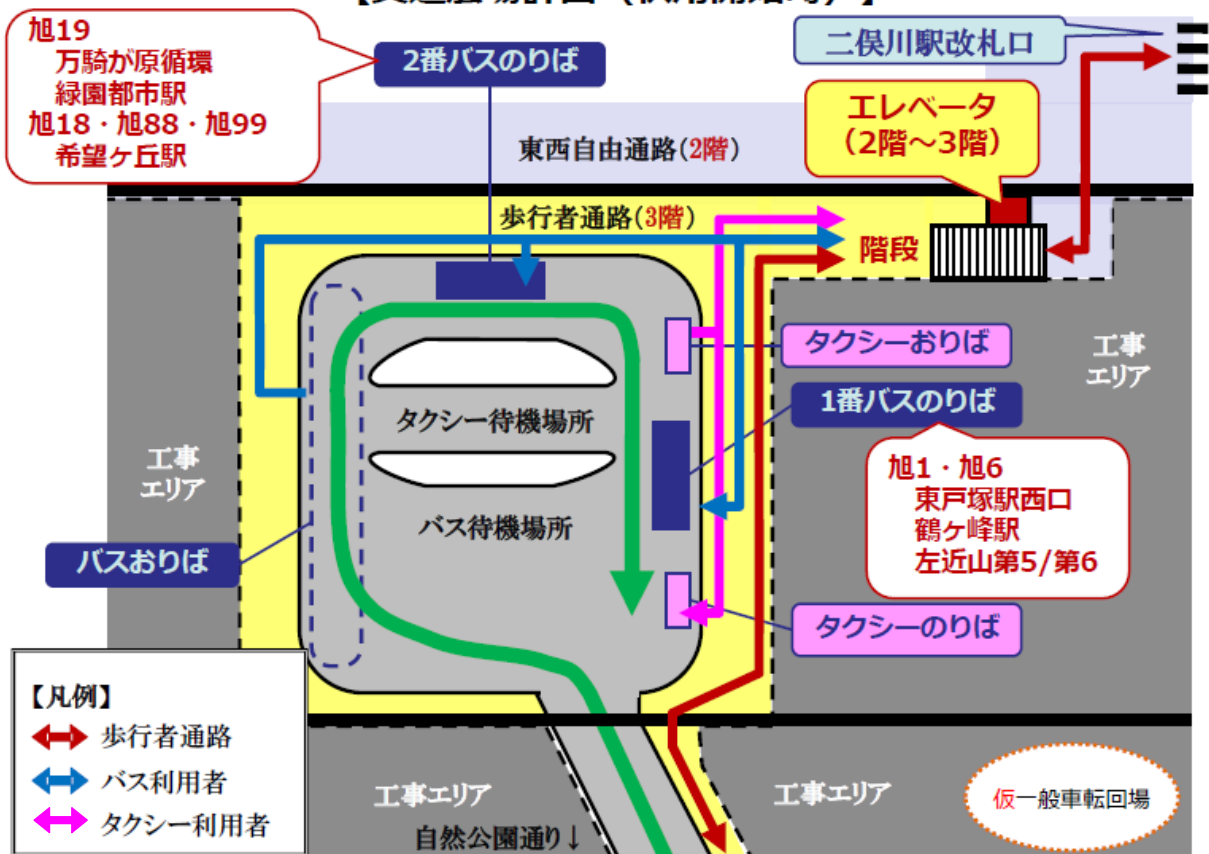

《今後工事の進捗により形態を変更する場合があります。》

編集：二俣川駅南口地区市街地再開発組合

※このニュースに関するご意見・お問合せは組合事務局までご連絡下さい。

《 TEL：045-744-5447 URL：<http://www.futamata-minami.jp> 》

組合事務所所在地：横浜市旭区二俣川2丁目56番地 アルジャンテ森ビル306号室
